

南安溪寮小給二之十三等 7 線改善工程

生態檢核自評表-規劃設計階段

民國 115 年 9 月

農業部農田水利署工程生態檢核自評表-架構

階段	表格名稱	附表	主辦機關	主辦生態團隊	設計單位	監造單位	營造單位
不分階段 共同單表	生態檢核-總表	✓	○	●			
	生態檢核分級表	✓	○	●			
	工程生態檢核基本資料表	✓	○	●			
	民眾參與及資訊公開彙整表	✓	○	●			
核定階段	團隊名單	P-1	○	●			
	生態情資蒐集	P-2	○	●			
	現勘紀錄表	P-3	○	●			
	民眾參與紀錄表	P-4	○	●			
	生態保育原則	P-5	○	●			
規劃設計階段	團隊名單	D-1	○	●	○		
	工區生態資料蒐集成果更新	D-2	○	○	●		
	現勘調查紀錄表	D-3	○	○	●		
	民眾參與紀錄表	D-4	○	○	●		
	生態關注區域繪製與生態保全對象指認	D-5	○	○	●		
	生態保育措施研擬	D-6	○	○	●		
施工階段	團隊名單	W-1	○	●		○	○
	施工前生態保育措施確認表	W-2	○	○	●	○	○
	施工中生態保育措施抽查表(主辦)	W-3.1	○	●		○	○
	施工中生態保育措施抽查表(監造)	W-3.2	○	○		●	○
	施工中生態保育措施自主檢查表(營造)	W-4	○	○		○	●
	生態異常狀況處理表(主辦)	W-5.1	○	●		○	○
	生態異常狀況處理表(監造)	W-5.2	○	○		●	○
	生態異常狀況處理表(營造)	W-5.3	○	○		○	●
	民眾參與紀錄表	W-6	○	●		○	○
維護管理階段	完工後生態保育措施執行成效	M-1	○	●			
	現勘監測紀錄表(視需要填寫)	M-2	○	●			

※ ●為表單主要填寫之機關單位；○為協助或參與之機關單位。

農業部農田水利署工程生態檢核自評表

工程基本資料	生態檢核-總表		☐ 第一級生態檢核 ☒ 第二級生態檢核		填寫單位 主辦生態團隊
	工程/計畫名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程	主辦機關	農田水利署嘉南管理處	
			設計單位	農田水利署嘉南管理處新營分處	
	工程預計 期程	115年7月31日~116年01月31日	監造單位	農田水利署嘉南管理處新營分處	
	基地位置	地點： <u>台南</u> （市）， <u>新營、後壁</u> （區）	工程預算/經費 （千元）	6,200	
	工程目的	改善支分線輸水功能，減少輸水損失，以達整體輸配水改善成效。			
	工程類型	☒ 灌溉圳路 ☐ 農田排水 ☐ 水利設施 ☐ 其他			
	工程概要	南安溪寮小給 2-13(0+000~0+222)：矩形溝 222m 寬 0.60(m) 牆高 0.50(m) TWD97 起(X=183667, Y=2579815); 迄(X=183459, Y=2579736) 埔洋小給 1-15(0+000~0+054)：矩形溝 54m 寬 0.50(m) 牆高 0.50(m) TWD97 起(X=179106, Y=2582322); 迄(X=179161, Y=2582326) 北新港東小給 3-1(0+817~0+971)：矩形溝 154m 寬 0.60(m) 牆高 0.50(m) TWD97 起(X=182048, Y=2583358); 迄(X=181887, Y=2583347) 長短樹小給 3(0+019~0+167)：矩形溝 148m 寬 0.60(m) 牆高 0.60(m) TWD97 起(X=182338, Y=2584698); 迄(X=182182, Y=2584632) 寮子小給 3-3(0+098~0+206)：矩形溝 108m 寬 0.60(m) 牆高 0.60(m) TWD97 起(X=183838, Y=2582526); 迄(X=183738, Y=2582519) 埔洋小給 3-1(0+752~1+054)：矩形溝寬 0.60(m) 牆高 0.60(m)83m；寬 0.80(m) 牆高 0.70(m)214m TWD97 起(X=179522, Y=2582165); 迄(X=179489, Y=2582453) 埔洋小給 3-15(0+001~0+123.5)：矩形溝 108m 寬 0.50(m) 牆高 0.60(m)；箱涵 5.5m 寬 0.50(m)牆高 0.80(m) TWD97 起(X=179524, Y=2582167); 迄(X=179604, Y=2582247)			
預期效益					

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
核定階段	專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ■是 □否	P-1
	生態資料蒐集調查	地理位置	區位：□生態敏感區 ■非生態敏感區 (生態敏感區包含國家公園、野生動物重要棲息環境、野生動物保護區、森林及森林保護區、國際及國家級重要濕地、自然保留區、自然保護區、海岸保護區、水庫蓄水範圍、IBA 重要鳥類棲息地及其他經認定生態資源豐富或具有生態課題之地理區域。)	P-2
		關注物種、重要棲地及高生態價值區域	1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ ■是 關注物種名錄包括一級保育類的草鴉，二級彩鵲、環頸雉、水雉，三級燕鵲、福建金線蛙，一般類小水鴨，共7種 □否 2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ ■是 草鴉、彩鵲、環頸雉、水雉 棲息之農田環境 □否	

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
核定階段	生態保育原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ ■是 □否	P-5
		採用策略	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕、補償策略，減少工程影響範圍？ ■是 迴避、縮小、減輕 □否	
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ ■是 □否	-
	民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ ■是 □否	P-3 P-4
	資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ ■是 □否	P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是 □否	D-1

規劃設計階段	基本資料蒐集調查	生態環境及議題	1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ☒是 ☐否 2. 是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象？ ☒是 ☐否	D-2 D-3 D-5
	生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ☒是 ☐否	D-6
	民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見？ ☒是 ☐否	D-4
	設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ☒是 ☐否	D-6
	資訊公開	設計資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ ☒是 ☐否	D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
施工階段	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ☐ 是 ☐ 否	W-1
	施工前生態保育措施確認、施工中生態保育措施抽查及自主檢查、生態異常狀況處理	施工廠商	1. 是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ ☐ 是 ☐ 否 2. 是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ☐ 是 ☐ 否	W-2
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ☐ 是 ☐ 否	
		生態保育品質管理措施	1. 履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？ ☐ 是 ☐ 否 2. 是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ ☐ 是 ☐ 否 3. 施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ ☐ 是 ☐ 否 4. 施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ ☐ 是 ☐ 否	W-3.1 W-3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3
		民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見？ ☐ 是 ☐ 否
	資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ ☐ 是 ☐ 否	W-1 W-2 W-3.1 W3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3 W-6
維護管理階段	生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ ☐ 是 ☐ 否	M-1 M-2
	資訊公開	維護管理資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ ☐ 是 ☐ 否	M-1 M-2
填表人		農田水利署嘉南管理處新營分處 工程員 鄭靖翰		單位主管核定 

備註：本表由主辦生態團隊填寫，主辦機關提供工程基本資料。

生態檢核分級表			填寫單位 主辦生態團隊
工程或計畫名稱	南安溪寮小給二之十三等 7 線改善工程	工程編號	嘉南 115SA10
執行機關	農田水利署嘉南管理處	承包廠商	
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處/工程員	填表日期	115 年 4 月 13 日
生態檢核分級	符合下列情形之一者，應確認是否涉及生態環境保育議題： ☒ 原構造物範圍內之整建或改善之工程。 ☐ 已開發場所之工程。 ☐ 道路鋪面及其附屬設施維護改善工程 ☐ 水井工程 ☐ 農田水利設施新建工程。 ☐ 學術研究單位及生態保育團體關注之區域。 ☐ 受本署補助比率逾工程建造經費 50% 之新建工程。 ☐ 經上級機關評估特別需要並通知者。 生態檢核分級評估： 1. 是否位於生態敏感區？ ☐ 是：(如涉及墾丁國家公園、龍鑾潭國家重要濕地等)，須辦理第一級生態檢核作業 ☒ 否(請續填第 2 項) 2. 是否有關注物種或關注棲地？ ☒ 是：草鴉、彩鵲、環頸雉、水雉、燕鴿、小水鴨、福建金線蛙(請填第 4 項) ☐ 否(請續填第 3 項) 3. 當地是否有生態相關議題？ ☒ 是，請續填第 4 項 關注議題：☐ 在地居民，關注原因：_____。 ☐ NGO 團體、學術研究團體，關注原因：_____。 ☒ 蒐集生態相關文獻，關注原因：<u>草鴉、彩鵲、環頸雉、水雉等保育類生物棲息之農田環境。</u> ☐ 否，經主辦機關自評無涉及生態環境保育議題，且經上級機關審查確認，無須辦理生態檢核作業，請勾選無須辦理生態檢核作業。 4. 工程採購金額是否 ≥ 2 千萬元？ ☐ 是：若第 2 項或第 3 項選是，須辦理第一級生態檢核作業 ☒ 否：若第 2 項或第 3 項選是，須辦理第二級生態檢核作業 5. 本工程生態檢核分級 ☐ 第一級生態檢核作業 ☒ 第二級生態檢核作業 ☐ 無須辦理生態檢核作業		

說明： 第一級：落實全週期生態檢核工作，建議於規劃及設計階段生態檢核編列生態調查費用進行現地調查，並填列相關表單擬定生態友善機制；於施工階段定期填具抽查表及自主檢查表外，應成立生態團隊持續監測生態保育措施執行狀況；完工後一至三年內進行維護管理階段以追蹤生態環境恢復情況。 第二級：由執行機關、設計、監造及施工人員進行自主檢核。機關得視需求邀請生態團隊協助工程人員執行生態檢核作業、或提升為第一級生態檢核作業。			
基本資料蒐集檢核			
資訊類別	資料項目	資料內容	
關注物種或關注棲地	■關注物種	☒ 有： <u>草鴉、彩鵲、環頸雉、水雉、燕鵲、福建金線蛙、小水鴨</u> ☐ 無	
	■關注棲地	☒ 有： <u>國土綠網關注區域(西南三)</u> ☐ 無	
生態敏感區說明			
資料類別	確認資料項目	是否涉及	相關法源(主管機關)
生態敏感區	國家公園及國家自然公園	☐ 是， ☒ 否	1. 國家公園法(內政部)
	野生動物重要棲息環境	☐ 是， ☒ 否	2. 水利法(經濟部)
	野生動物保護區	☐ 是， ☒ 否	3. 水庫蓄水範圍使用管理辦法(經濟部)
	森林及森林保護區(保安林)	☐ 是， ☒ 否	4. 海岸管理法(內政部)
	森林及森林保護區(國有林事業區)	☐ 是， ☒ 否	5. 野生動物保育法(農業部)
	重要濕地(國際級)	☐ 是， ☒ 否	6. 野生動物保育法施行細則(農業部)
	重要濕地(國家級)	☐ 是， ☒ 否	7. 森林法(農業部)
	重要濕地(地方級)	☐ 是， ☒ 否	8. 自然保護區設置管理辦法(農業部)
	自然保留區	☐ 是， ☒ 否	9. 濕地保育法(內政部)
	自然保護區	☐ 是， ☒ 否	10. 濕地保育法施行細則(內政部)
	海岸保護區	☐ 是， ☒ 否	11. 文化資產保存法(文化部)
	水庫蓄水範圍	☐ 是， ☒ 否	
	IBA 重要鳥類棲息地	☐ 是， ☒ 否	
其他經認定生態資源豐富或具有生態課題之地理區域	石虎重要及潛在棲地	☐ 是， ☒ 否	
	國土生態綠網關注農田圳溝或埤塘池沼	☐ 是， ☒ 否	
	國土生態綠網關注獨流溪	☐ 是， ☒ 否	
	其他： <u>國土生態綠網保育軸帶&關注區域</u>	☐ 是， ☒ 否	


備註：本表由主辦生態團隊填寫，如有需要可自行增加欄位及分頁，並註明政府公佈之資料出處。主辦機關提供工程基本資料、承包商資訊。

工程生態檢核基本資料表		☐ 第一級生態檢核 ☒ 第二級生態檢核		填寫單位 主辦生態團隊		
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程					
治理機關	農田水利署嘉南管理處	工程類型 ☒ 灌溉圳路 ☐ 農田排水 ☐ 水利設施 ☐ 其他	工程地點	台南市 新營區 後壁區		
勘查日期	115 年 2 月 05 日			TWD97 坐標		
				南安溪寮小給 2-13	起 X=183667 Y=2579815	迄 X:183800 Y:2579875
				埔洋小給 1-15	起 X=179106 Y=2582322	迄 X=179161 Y=2582326
				北新港東小給 3-1	起 X=182048 Y=2583358	迄 X=181887 Y=2583347
				長短樹小給 3	起 X=182338 Y=2584698	迄 X=182182 Y=2584632
				寮子小給 3-3	起 X=183838 Y=2582526	迄 X=183738 Y=2582519
				埔洋小給 3-1	起 X=179522 Y=2582165	迄 X=179489 Y=2582453
				埔洋小給 3-15	起 X=179524 Y=2582167	迄 X=179604 Y=2582247
					水系名稱	南安溪寮小給 2-13-急水溪流域 其他 6 線-八掌溪流域
工程緣由目的	水利設施系統強化		擬辦工程概估內容	南安溪寮小給 2-13(0+000~0+222)：矩形溝 222m 寬 0.60(m) 牆高 0.50(m) 埔洋小給 1-15(0+000~0+054)：矩形溝 54m 寬 0.50(m) 牆高 0.50(m) 北新港東小給 3-1(0+817~0+971)：矩形溝 154m 寬 0.60(m) 牆高 0.50(m) 長短樹小給 3(0+019~0+167)：矩形溝 148m 寬 0.60(m) 牆高 0.60(m) 寮子小給 3-3(0+098~0+206)：矩形溝 108m 寬 0.60(m) 牆高 0.60(m) 埔洋小給 3-1(0+752~1+054)：矩形溝寬 0.60(m) 牆高 0.60(m)83m；寬 0.80(m) 牆高 0.70(m)214m 埔洋小給 3-15(0+001~0+123.5)：矩形溝 108m 寬 0.50(m) 牆高 0.60(m)；箱涵 5.5m 寬 0.50(m)牆高 0.80(m)		

災害紀錄	1.災害類別： 2.災情： 3.以往處理情形：_____單位已施設 4.有無災害調查報告 (報告名稱：_____) 5.其他：_____	預期效益	
生態情報 釐清及建議	關注議題或保護對象	資訊來源	
	生態敏感區：非生態敏感區 關注棲地或關注物種：本團隊所列關注物種名錄，包括一級保育類的草鴉，二級彩鵲、環頸雉、水雉，共4種	內政部營建署、農業部林業及自然保育署。 台灣特生中心生態多樣性網格(TBN) eBird Taiwan 資料庫系統	
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程 ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 設施老舊極需改善之工程 ☐ 以往治理工程(年度工程)維護改善 ☐ 其他_____		
棲地現況說明：該施工區段皆為農田環境，主要作物為稻米及玉米，現勘月份為10月，正植種植期，鳥類將裸露地作為視野廣闊之停憩空間，農地係人為種植作物之土地，植物相較單調且垂直分層少，生物多為植食性之無脊椎動物及其掠食者，且行為模式易受耕作方式影響。			
可能造成之生態環境影響： ☒ 水流量改變 ☐ 水域生物通道阻隔或棲地切割 ☐ 阻礙坡地植被演替 ☒ 減少植被覆蓋 ☐ 濁度升高 ☒ 大型施工便道施作 ☐ 土方挖填棲地破壞 ☒ 其他：新設斷面為矩型溝光滑垂直恐增幼雛墜落無法逃脫情況			
生態保育原則建議： ☐ 植生復原 ☐ 底質保留 ☒ 棲地保留 ☒ 友善生態廊道 ☒ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 物種補充調查 ☒ 生態影響減輕對策：施工時段至8:00~日落前1小時，施作時留意是否有幼雛或巢卵 ☒ 其他：增設動物逃脫生態廊道設施			

勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理：本工程南安溪寮小給2-13、北新港東小給3-1、長短樹小給3、寮子小給3-3、埔洋小給3-1及埔洋小給3-15，位於一般區，主要生態課題為水田及早田，環境有多種涉禽與陸禽類棲息，可能受水泥化圳路阻礙通行，施工期盡量迴避春夏季，並避開晨昏，若工期無法迴避，應以警示帶等設施明確劃設施作範圍，並縮小施工範圍，減少周圍鳥類棲地擾動，為使幼雛墜落無法逃生，擬增設渠道生態爬坡(依改善區段長度施設，共計9處)。		
	☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本單位權責，移請(單位：)研處 ☐ 用地取得問題需再協調 ☐ 其他：		
填寫人員/單位	鄭靖翰/嘉南管理處新營分處	提交日期	115年7月6日

※工程位置圖：

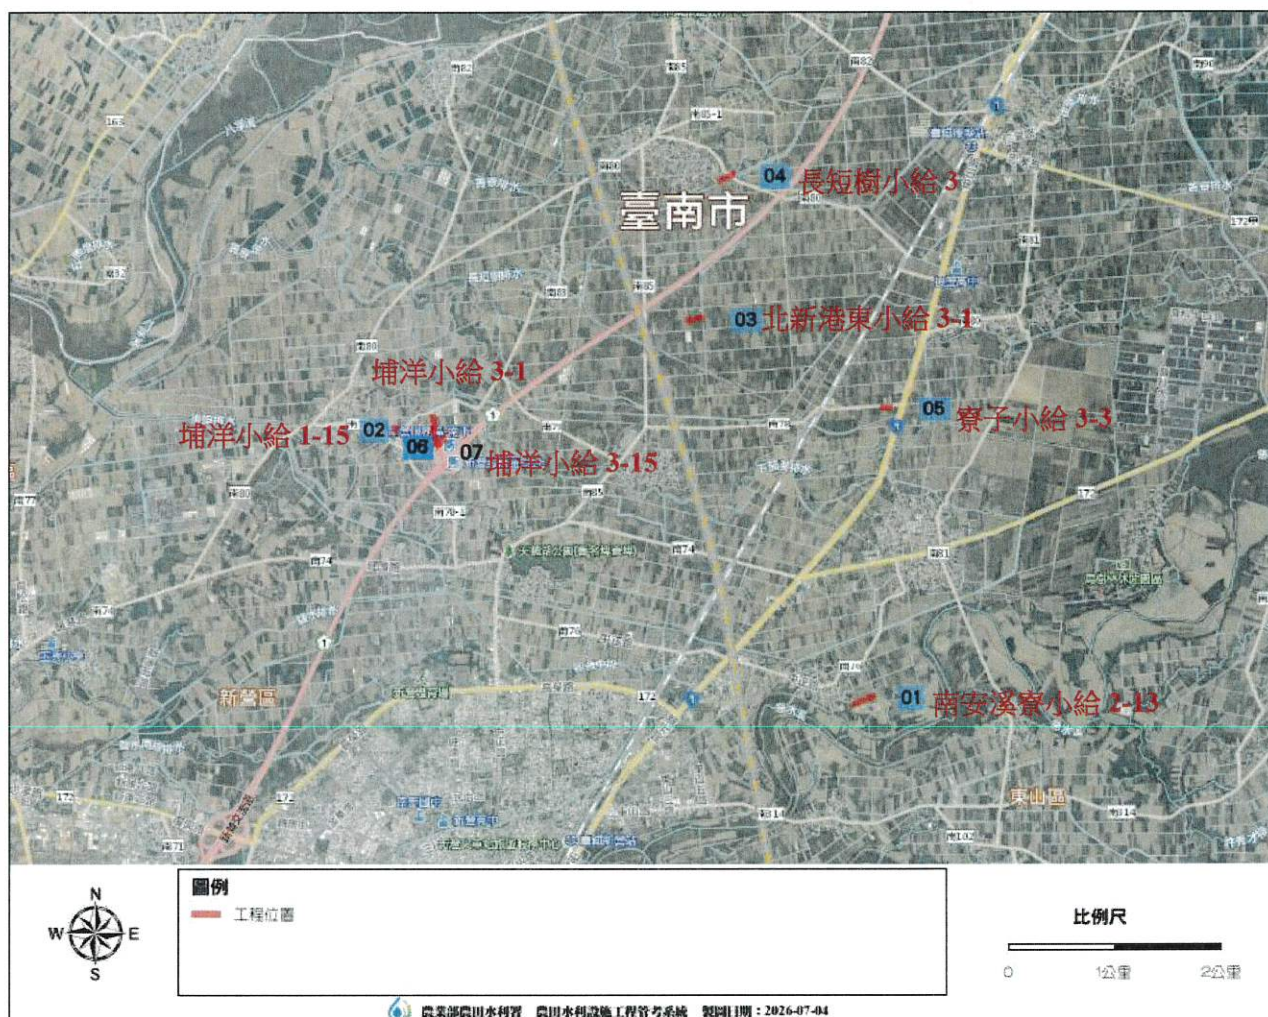

備註：本表由主辦生態團隊填寫，由主辦機關提供現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述；擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。

※工程預定位置棲地環境照片：



時間：115 年 2 月 05 日
說明：南安溪寮小給 2-13



時間：115 年 3 月 25 日
說明：北新港東小給 3-1



時間：115 年 3 月 25 日
說明：長短樹小給 3



時間：115 年 3 月 25 日
說明：寮子小給 3-3



時間：115 年 2 月 05 日
說明：埔洋小給 3-1



時間：115 年 2 月 05 日
說明：埔洋小給 3-15


備註：表格欄位不足請自行增加。

民眾參與及資訊公開彙整表			填寫單位
			主辦生態團隊
主辦機關	農田水利署嘉南管理處	設計單位	農田水利署嘉南管理處新營分處
監造單位	農田水利署嘉南管理處新營分處	營造單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等 7 線改善工程		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處/工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日
檢核事項	檢核階段	內容項目及公開方式	
主動公開	檢核階段	本案於 115 年 4 月 13 日辦理核定階段民眾參與，相關訪談會議資料將於計畫核定後，主動公開於官方網站。	
主動公開	規劃設計階段	本案於 115 年 8 月 5 日辦理設計規畫階段民眾參與，相關訪談會議資料將於計畫核定後，主動公開於官方網站。	
被動公開			

備註：本表由主辦生態團隊彙整填寫，並由主辦機關提供相關本工程民眾參與及資訊公開之資料。

規劃設計階段

D-2-1 工區生態資料蒐集成果更新		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-南安溪寮小給二之十三		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日
工程範圍圖： (請依工程設計內容更新加以修正)			
南安溪寮小給2-13(安溪站)			

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍 所涉及潛 在關注物 種與棲地	1. 草鴞	主要棲息在高度密集的草生地、河川高灘地、休耕農地及丘陵惡地，屬於地面築巢與棲息的夜行性猛禽，母鳥留守育幼而公鳥負責外出捕食小型哺乳動物，極度依賴高密度的草生地，並偏好利用白茅築地育幼。<u>繁殖季主要介於每年9月至隔年4月之間</u>，地面棲息與築巢：與多數棲息於樹上的貓頭鷹不同，草鴞白天常隱蔽於濃密的草叢中，並踩踏出圓頂狀的休息平台，通常也在地面築巢並利用草叢中的隧道進出。<u>夜行性</u>掠食者：生性敏感害羞，主要依靠優異的聽覺在夜間捕捉小型齧齒動物（如野鼠）。飛行特徵：受驚擾時會從草叢中低飛竄出，飛行速度緩慢且低空滑翔，隨後便會快速直落回草叢中隱蔽。	 (圖片擷自網路)
	2. 彩鷸	分布於低海拔的濕地，常在沼澤、水田、池塘、河邊等濕地出現。主要是晨昏活動，也會在夜間覓食，白天藏匿於草叢中。能游泳，飛行慢，飛行時雙腳下垂。會單獨行動或形成小群，有時也會形成數十隻的大群。在台灣的彩鷸以水稻田為主要的覓食棲地。 牠們具有性別反轉的求偶行為、一妻多夫制，<u>繁殖期大約在每年4月至7月</u>，且由<u>雄鳥負責全職育雛</u>。	 (圖片擷自網路)
	3. 水雉	水雉主要生活於平原地區的淡水沼澤、湖泊、埤塘及水生植物茂盛的菱角田(又有「菱角鳥」之稱)溼地中。 獨特移動方式：因其腳趾與爪極長，能將體重有效分散於浮葉上。 <u>繁殖期約在每年4月至9月雄鳥獨自負責孵卵與育雛</u>，會獨自進行約25到27天的孵蛋工作，並照顧剛破殼且迅速能隨親鳥覓食的幼雛直到獨立。食性：主要以水生昆蟲、小魚、螺類及菱角田中的浮游生物為食。季節性換羽：夏季繁殖期會換上亮麗的「繁殖羽」（頭頸純白、頸背金黃、具黑長尾羽）；冬季則換為較樸素的非繁殖羽，長尾羽脫落，體色轉為褐色。	 (圖片擷自網路)

備註：

本表由設計單位填寫，主辦機關及主辦生態團隊協助提供相關資料。

D-2-2 工區生態資料蒐集成果更新		填寫單位
		設計單位
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-北新港東小給三之一	
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處 工程員	填表日期 115 年 8 月 5 日
工程範圍圖： (請依工程設計內容更新加以修正)		
北新港東小給3-1(仕安站) 資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統 列印時間：2026/6/11 20:34		
生態資料蒐集成果更新：本案經圖資套疊，施工區段未涉及「生態敏感區」，故本案以第二級生態檢核進行辦理，目前已掌握本工區易受工程影響的關注物種包括二級保育類彩鷸、水雉共2種。		
可能造成之生態影響： ☐ 水流量改變 ☒ 水域生物通道阻隔或棲地切割 ☐ 阻礙坡地植被演替 ☒ 減少植被覆蓋 ☐ 濁度升高 ☒ 大型施工便道施作 ☐ 土方挖填棲地破壞 ☒ 其他：可能造成幼雛墜落矩型溝無法自行脫困		

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍 所涉及潛 在關注物 種與棲地	1. 彩鷸	分布於低海拔的濕地，常在沼澤、水田、池塘、河邊等濕地出現。主要是晨昏活動，也會在夜間覓食，白天藏匿於草叢中。能游泳，飛行慢，飛行時雙腳下垂。會單獨行動或形成小群，有時也會形成數十隻的大群。在台灣の彩鷸以水稻田為主要的覓食棲地。 牠們具有性別反轉的求偶行為、一妻多夫制，<u>繁殖期大約在每年4月至7月</u>，且由<u>雄鳥負責全職育雛</u>。	 (圖片擷自網路)
	2. 水雉	水雉主要生活於平原地區的淡水沼澤、湖泊、埤塘及水生植物茂盛的菱角田(又有「菱角鳥」之稱)溼地中。 獨特移動方式：因其腳趾與爪極長，能將體重有效分散於浮葉上。 <u>繁殖期約在每年4月至9月雄鳥獨自負責孵卵與育雛</u>，會獨自進行約25到27天的孵蛋工作，並照顧剛破殼且迅速能隨親鳥覓食的幼雛直到獨立。食性：主要以水生昆蟲、小魚、螺類及菱角田中的浮游生物為食。季節性換羽：夏季繁殖期會換上亮麗的「繁殖羽」(頭頸純白、頸背金黃、具黑長尾羽)；冬季則換為較樸素的非繁殖羽，長尾羽脫落，體色轉為褐色。	 (圖片擷自網路)

D-2-3 工區生態資料蒐集成果更新		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-長短樹小給三		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日
工程範圍圖： (請依工程設計內容更新加以修正)			
長短樹小給3(仕安站) 資料來源：農田水利灌溉管理整合資訊系統 列印時間：2026/6/11 20:48			

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍 所涉及潛 在關注物 種與棲地	1. 彩鷸	分布於低海拔的濕地，常在沼澤、水田、池塘、河邊等濕地出現。主要是晨昏活動，也會在夜間覓食，白天藏匿於草叢中。能游泳，飛行慢，飛行時雙腳下垂。會單獨行動或形成小群，有時也會形成數十隻的大群。在台灣彩鷸以水稻田為主要的覓食棲地。 牠們具有性別反轉的求偶行為、一妻多夫制，<u>繁殖期大約在每年4月至7月</u>，且由<u>雄鳥負責全職育雛</u>。	 (圖片擷自網路)
	2. 環頸雉	又名啼雞，環頸雉生活在平地與淺山開闊環境的大型陸生鳥類，主要棲息於草地、農耕地與河川溪床。 物種行為與習性地棲與移動：擅長在地面步行奔跑，飛行能力較弱且短暫，通常在遭遇危險時短距離起飛或迅速鑽入草叢隱蔽。覓食習性：屬雜食性，以草籽、農作物（如穀物、豆類）、嫩芽及昆蟲為主，多於清晨和黃昏時刻最為活躍。社會與繁殖：<u>春季繁殖期</u>公鳥會建立領域，發出響亮鳴叫並吸引多隻母鳥（一夫多妻制），採地面簡易凹地築巢。喜歡早晨日出時至9時左右覓食行動，中午烈日時躲在草叢樹林休息，下午2時後開始活動至6時回巢休息。	 (圖片擷自網路)

D-2-4 工區生態資料蒐集成果更新			填寫單位
			設計單位
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-寮子小給三之三		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

工程範圍圖：

(請依工程設計內容更新加以修正)



生態資料蒐集成果更新：本案經圖資套疊，施工區段未涉及「生態敏感區」，故本案以第二級生態檢核進行辦理，目前已掌握本工區易受工程影響的關注物種包括二級保育類彩鷸共1種。


可能造成之生態影響：☐水流量改變 ☒水域生物通道阻隔或棲地切割 ☐阻礙坡地植被演替 ☒減少植被覆蓋
☐濁度升高 ☒大型施工便道施作 ☐土方挖填棲地破壞 ☒其他：可能造成幼雛墜落矩型溝無法自行脫困

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍 所涉及潛 在關注物 種與棲地	彩鷸	分布於低海拔的濕地，常在沼澤、水田、池塘、河邊等濕地出現。主要是晨昏活動，也會在夜間覓食，白天藏匿於草叢中。能游泳，飛行慢，飛行時雙腳下垂。會單獨行動或形成小群，有時也會形成數十隻的大群。在台灣的彩鷸以水稻田為主要的覓食棲地。 牠們具有性別反轉的求偶行為、一妻多夫制，繁殖期大約在每年4月至7月，且由雄鳥負責全職育雛。	 (圖片擷自網路)

D-2-5 工區生態資料蒐集成果更新		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-埔洋小給三之一、埔洋小給三之十五		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

工程範圍圖：

(請依工程設計內容更新加以修正)

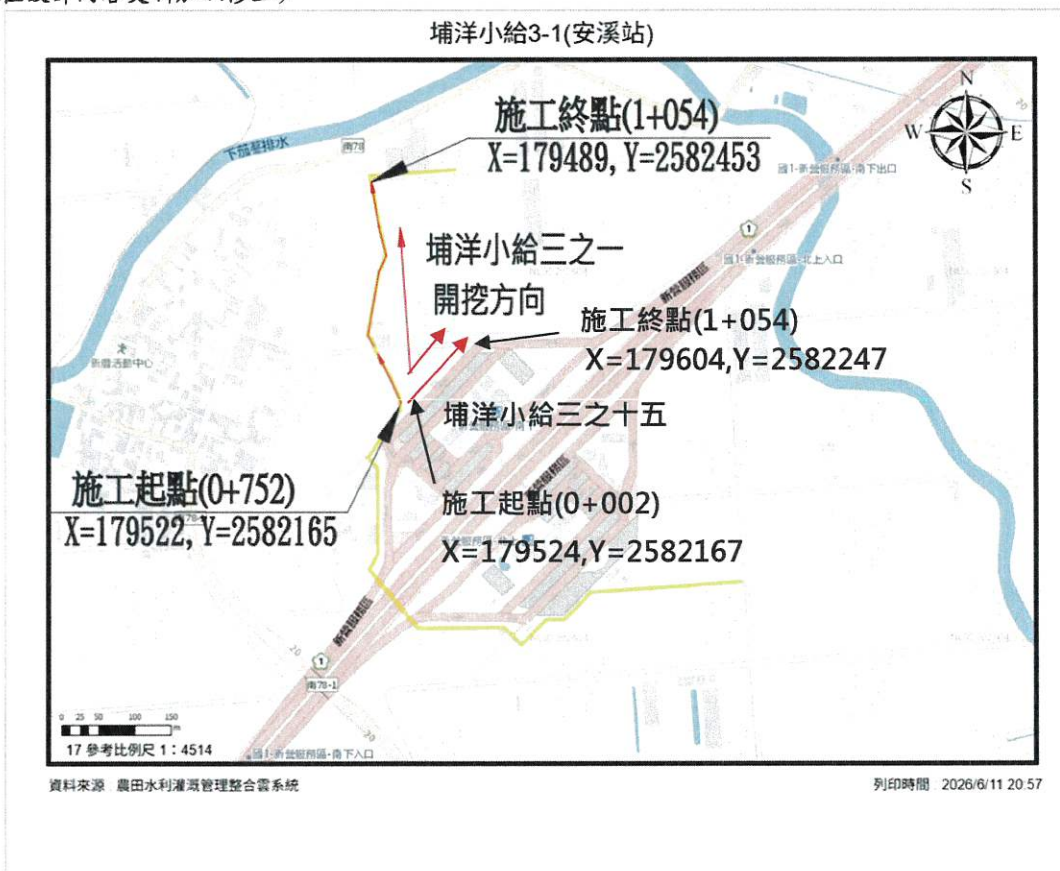

生態資料蒐集成果更新：本案經圖資套疊，施工區段未涉及「生態敏感區」，故本案以第二級生態檢核進行辦理，目前已掌握本工區易受工程影響的關注物種包括三級保育類福建金線蛙共1種。

可能造成之生態影響：☐水流量改變 ☒水域生物通道阻隔或棲地切割 ☐阻礙坡地植被演替 ☒減少植被覆蓋
☐濁度升高 ☒大型施工便道施作 ☐土方挖填棲地破壞 ☒其他：可能造成幼雛墜落矩型溝無法自行脫困

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍 所涉及潛 在關注物 種與棲地	福建金線蛙	主要在春、夏兩季(約3月至8月)進行繁殖，喜好棲息於平地及低海拔山區、遮蔽良好的靜水域農田與草澤(如稻田、芋田、茭白筍田或長滿水草的蓄水池與溝渠)，生性隱密機警、常只露出頭部觀察四周，受驚擾時會立刻跳入水。	
			(圖片擷自網路)

D-3 現勘調查紀錄表			填寫單位
			設計單位
現勘日期	115 年 8 月 5 日	填表人/ 生態團隊	鄭靖翰
現勘地點 (坐標 TWD97)	南安溪寮小給 2-13 起(0+000) (X:184078;Y:2579972) 北新港東小給 3-1 起(0+817) (X:182048,Y:2583358) 長短樹小給 3 起(0+019) (X:182338,Y:2584698) 寮子小給 3-3 起(0+098) (X:183838,Y:2582526) 埔洋小給 3-1 起(0+752) (X:179522,Y:2582165) 埔洋小給 3-15 起(0+001) (X:179524,Y:2582167)	工程名稱	南安溪寮小給二之十三等 7 線改善工程
現場勘查概述		照片及說明(棲地/物種等照片)	
1. 棲地現況描述： (記錄工程影響範圍內水陸域生態或棲地環境現況)： 南安溪寮小給二之十三 渠道兩側以 1、2 期水稻、玉米為主，會在 1-5 月與 7-11 月的播稻期供水灌溉。			
		日期：115 年 2 月 05 日 位置：南安溪寮小給二之十三	

北新港東小給三之一 渠道兩側以 1、2 期水稻為主，會在 1-5 月與 7-11 月的播稻期供水灌溉。	日期：115 年 3 月 25 日 位置：北新港東小給三之一	
長短樹小給三 渠道右側以 1、2 期水稻為主，會在 1-5 月與 7-11 月的播稻期供水灌溉。	日期：115 年 3 月 25 日 位置：長短樹小給三	
寮子小給三之三 渠道左側以 1、2 期水稻為主，會在 1-5 月與 7-11 月的播稻期供水灌溉。	日期：115 年 3 月 25 日 位置：寮子小給三之三	

埔洋小給三之一 渠道兩側以 1、2 期水稻、雜作為主，會在 1-5 月與 7-11 月的播稻期供水灌溉。	日期：115 年 2 月 05 日 位置：埔洋小給三之一
埔洋小給三之十五 渠道左側以雜作為主，會在 1-5 月與 7-11 月的播稻期供水灌溉。	日期：115 年 2 月 05 日 位置：埔洋小給三之十五

備註：

1. 本表由設計單位填寫，主辦機關及主辦生態團隊協助提供相關資料。
2. 表格欄位不足請自行增加。

物種補充調查概述	照片及說明(棲地/物種等照片)	
2. 是否辦理物種補充調查? ☐ 是, 請續填第 3 項 ☒ 否。請續填第 4 項 1. 物種補充調查結果概述: 陳述調查目的及方法, 以及說明調查物種或生物類群, 並於調查完成後提出調查成果, 分析及評估調查成果與工程影響之關聯性。析及評估調查成果與工程影響之關聯性。		物種照片 1 日期: 位置: 物種照片 2 日期: ○年○月○日 位置: 地點概述
4. 現勘結果與建議: 該區為早作田作物, 人為擾動大, 生物多樣性較低, 建議避開春夏季施作, 減低對鳥類的擾動, 施工區段以警示帶明確劃施作範圍避免過度干擾到原訂工區以外的環境, 並增設生態爬坡, 以利幼雛落溝後逃生		

D-4-1 民眾參與紀錄表			填寫單位
			設計單位
辦理日期	115 年 8 月 5 日	工程名稱	南安溪寮小給二之十三等 7 線改善工程- 南安溪寮小給二之十三 埔洋小給三之一 埔洋小給三之十五
地點	台南市新營區 後壁區	工程階段	☐ 核定階段 ☒ 規劃設計階段 ☐ 施工階段
辦理方式	☒ 說明會 ☐ 訪談 ☐ 現勘 ☐ 工作坊 ☒ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
蘇●傑 王●祥 廖●德 陳●傑 林●向 王●男		☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他(耕作者)	
鄭靖翰	安溪工作站站員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他(耕作者)	
陳俊志	安溪工作站站長	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他(耕作者)	
意見摘要		處理情形回覆	
安溪工作站站長意見：再次討論確認保育措施與先前無誤，說明會也了解需要注意細節，針對爬坡設置位置，還請設計人員檢視是否正確。		回覆人員 鄭靖翰：感謝站長提醒，本案於各施工區段約 150 公尺距離增設生態爬坡，以利動物逃脫通行。	
陳●傑先生意見：完成日後如有枯枝落葉卡住可能會影響水流。		回覆人員 陳俊志：感謝建議，日後如果有異物卡住會請協勤人員加強管理，也請地方農民自主清理渠道維護自身用水權益，維持在地的良好環境。	

備註：

1. 本表由設計單位依機關紀錄摘要整理填寫，由主辦機關回覆，主辦生態團隊協助提供相關資料。
2. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
3. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

D-4-2 民眾參與紀錄表			填寫單位
			設計單位
辦理日期	115 年 8 月 5 日	工程名稱	南安溪寮小給二之十三等 7 線改善工程- 北新港東小給三之一 長短樹小給三 寮子小給三之三
地點	台南市新營區 後壁區	工程階段	☐ 核定階段 ☒ 規劃設計階段 ☐ 施工階段
辦理方式	☒ 說明會 ☐ 訪談 ☐ 現勘 ☐ 工作坊 ☒ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
莊●成 王●有 沈●一		☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他(耕作者)_____	
鄭靖翰	安溪工作站站員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他(耕作者)_____	
翁錦上	仕安工作站站長	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他(耕作者)_____	
意見摘要		處理情形回覆	
仕安工作站站長意見：再次討論確認保育措施，因為本站有三條渠道，針對爬坡設置位置及尺寸，還請設計人員檢視是否正確。		回覆人員 鄭靖翰：感謝站長提醒，本案於北新港東小給三之一為 50 公分在右側外，長短樹小給三及寮子小給三之三尺寸為 60 公分在左側。仕安站 3 條各 3 處，寮子小給三之三因右岸為道路容易路殺，故設置於左岸，以利動物逃脫通行。	
王●有先生意見：完成後取水口是否被影響？		回覆人員 翁錦上：感謝提問，取水口請各位農民於施工中自行前往指定或確認，主體完工後會避開取水口設置爬坡，如設置位置影響取水，請農民盡早告知工作站。	

備註：

1. 本表由設計單位依機關紀錄摘要整理填寫，由主辦機關回覆，主辦生態團隊協助提供相關資料。
2. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
3. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

✕辦理情形照片：



說明：南安溪寮小給二之十三
埔洋小給三之一
埔洋小給三之十五
說明會(安溪工作站)



說明：北新港東小給三之一
長短樹小給三
寮子小給三之三
說明會(仕安工作站)

備註：表格欄位不足請自行增加。

規劃設計階段 民眾參與簽到簿

工程名稱：南安溪寮小給二之十三等7線改善工程

日期：8/5

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

時間		地點：南安溪寮小給2-13			
出席人員	出席人員		職稱	簽名(請以正楷簽寫以利辨識)	備註
	1	郭●			
	2	林●			
	3	廖●			
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

規劃設計階段 民眾參與簽到簿

工程名稱：南安溪寮小給二之十三等7線改善工程

日期：8/5

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

時間				地點：北新港東小給3-1	
出席人員	出席人員	職稱	簽名(請以正楷簽寫以利辨識)	備註	
	1	翁			
	2	葉			
	3	黃			
	4	沈			
	5	莊			
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

規劃設計階段 民眾參與簽到簿

工程名稱：南安溪寮小給二之十三等7線改善工程

日期：8/5

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

時間		地點：長短樹小給 3			
出席人員	出席人員		職稱	簽名(請以正楷簽寫以利辨識)	備註
	1	翁			
	2	李			
	3	黃			
	4	沈			
	5	王			
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

規劃設計階段 民眾參與簽到簿

工程名稱：南安溪寮小給二之十三等7線改善工程

日期：8/5

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

時間		地點：寮子小給 3-3		
出席人員	出席人員	職稱	簽名(請以正楷簽寫以利辨識)	備註
	1	翁		
	2	葉		
	3	黃		
	4	沈		
	5	沈		
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

規劃設計階段 民眾參與簽到簿

工程名稱：南安溪寮小給二之十三等7線改善工程

日期：8/5

主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處

時間				地點：埔洋小給 3-1、3-15	
出席人員	出席人員		職稱	簽名(請以正楷簽寫以利辨識)	備註
	1	王祥			
	2	陳傑			
	3	王男			
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

D-5-1 生態關注區域繪製與生態保全對象指認		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-南安溪寮小給二之十三		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

1. 生態關注區域圖：

南安溪寮小給2-13(安溪站)



資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統

列印時間：2026/8/10 10:30

2. 生態保全對象：

生態議題或生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
草鴉	1. 棲息於高密草生地及休耕農地 (現場無明顯高密草生地及休耕農地) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	迴避：確立保全對象之棲地，明確劃設保留範圍，避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境。
彩鵲	1. 棲息於平原濕地及水田(用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	縮小：工程限縮施作範圍，減少工區周遭環境擾動，縮短工期日數，減少棲地的擾動。
水雉	1. 棲息於埤塘、溼地(用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	減輕：避免晨昏及夜間施工，清除廢棄石塊及周遭垃圾，降低施工噪音。補償：增設生態爬坡以利逃生。

D-5-2 生態關注區域繪製與生態保全對象指認			填寫單位
			設計單位
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-北新港東小給三之一		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

1. 生態關注區域圖：

北新港東小給3-1(仕安站)



資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統

列印時間：2026/8/10 10:54

2. 生態保全對象：

生態議題或生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
彩鷸	1. 棲息於平原濕地及水田(用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	迴避：確立保全對象之棲地，明確劃設保留範圍，避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境。 縮小：工程限縮施作範圍，減少工區周遭環境擾動，縮短工期日數，減少棲地的擾動。
水雉	1. 棲息於埤塘、溼地(用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	減輕：避免晨昏及夜間施工，清除廢棄石塊及周遭垃圾，降低施工噪音。補償：增設生態爬坡以利逃生。

D-5-3 生態關注區域繪製與生態保全對象指認			填寫單位
			設計單位
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-長短樹小給三		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

1. 生態關注區域圖：

長短樹小給3(仕安站)



資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統

列印時間：2026/8/10 11:10

2. 生態保全對象：

生態議題或生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
彩鷸	1. 棲息於平原濕地及水田(用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	迴避：確立保全對象之棲地，明確劃設保留範圍，避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境。 縮小：工程限縮施作範圍，減少工區周遭環境擾動，縮短工期日數，減少棲地的擾動。
環頸雉	1. 棲息於農地(非用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	減輕：避免晨昏及夜間施工，清除廢棄石塊及周遭垃圾，降低施工噪音。補償：增設生態爬坡以利逃生。

D-5-4 生態關注區域繪製與生態保全對象指認		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-寮子小給三之三		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

1. 生態關注區域圖：

寮子小給3-3(仕安站)



資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統

列印時間：2026/8/10 11:17

2. 生態保全對象:

生態議題或生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
彩鷸	1. 棲息於平原濕地及水田(用水期間) 2. 掉落溝渠，被困風險提高 3. 路殺	迴避： 確立保全對象之棲地，明確劃設保留範圍，避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境。 縮小： 工程限縮施作範圍，減少工區周遭環境擾動，縮短工期日數，減少棲地的擾動。 減輕： 避免晨昏及夜間施工，清除廢棄石塊及周遭垃圾，降低施工噪音。 補償： 增設生態爬坡以利逃生。

D-5-5 生態關注區域繪製與生態保全對象指認		填寫單位	
		設計單位	
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程-埔洋小給三之一、埔洋小給三之十五		
填表人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處 工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日

1. 生態關注區域圖：

埔洋小給3-1；埔洋小給3-15(安溪站)



資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統

列印時間：2026/8/10 11:28

2. 生態保全對象:

生態議題或生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
福建金線蛙	1. 棲息於埤塘、溼地(用水期間) 2. 無水源遭孤立，被困風險提高 3. 路殺	迴避： 確立保全對象之棲地，明確劃設保留範圍，避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境。 縮小： 工程限縮施作範圍，減少工區周遭環境擾動，縮短工期日數，減少棲地的擾動。 減輕： 避免晨昏及夜間施工，清除廢棄石塊及周遭垃圾，降低施工噪音。 補償： 增設生態爬坡以利逃生。

D-6 生態保育措施研擬			填寫單位
			設計單位
工程名稱	南安溪寮小給二之十三等7線改善工程		
填表/人員 (單位/職稱)	鄭靖翰 嘉南管理處新營分處/工程員	填表日期	115 年 8 月 5 日
生態議題或 生態保全對象	生態保育措施		參採情形
關注物種/草鴞 (照片/圖片及相關說明)  (圖片擷自網路)	保育策略 迴避■縮小■減輕■補償□ 保育原則 確立保全對象之棲地，並明確劃設保留範圍且機具及工料移開保留範圍 避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境 避開晨昏及夜間施工並降低噪音 縮短工期，減少棲地的擾動 保育措施： (迴避)迴避鳥類繁殖季施工減少干擾 (縮小)限縮施工便道範圍，降低棲地破壞 (減輕)限縮施作時段至 8:00~日落前 1 小時，並留意是否有幼雛或產卵，如有發現，交由當地鳥會處理 (減輕)增設生態爬坡(約每 150 公尺設一處)以利幼雛逃脫	■納入工程計畫方案 □未納入，原因：	
關注物種/彩鹬 (照片/圖片及相關說明)  (圖片擷自網路)	保育策略 迴避■縮小■減輕■補償□ 保育原則 確立保全對象之棲地，並明確劃設保留範圍且機具及工料移開保留範圍 避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境 避開晨昏及夜間施工並降低噪音 縮短工期，減少棲地的擾動 保育措施： (迴避)迴避春夏季鳥類繁殖季施工減少干擾 (縮小)限縮施工便道範圍，降低棲地破壞 (減輕)限縮施作時段至 8:00~日落前 1 小時，並留意是否有幼雛或產卵，如有發現，交由當地鳥會處理 (減輕)增設生態爬坡(約每 150 公尺設一處)以利幼雛逃脫	■納入工程計畫方案 □未納入，原因：	

關注物種/環頸雉 (照片/圖片及相關說明)  (圖片擷自網路)	保育策略 迴避■縮小■減輕■補償□	確立保全對象之棲地，並明確劃設保留範圍 避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境 避開晨昏及夜間施工並降低噪音 縮短工期，減少棲地的擾動	保育措施： (迴避)迴避春夏季鳥類繁殖季施工減少干擾 (縮小)限縮施工便道範圍，降低棲地破壞 (減輕)限縮施作時段至 8:00~日落前 1 小時，並留意是否有幼雛或產卵，如有發現，交由當地鳥會處理 (減輕)增設生態爬坡(約每 150 公尺設一處)以利幼雛逃脫	■納入工程計畫方案 □未納入，原因：
	保育原則			
關注物種/水雉 (照片/圖片及相關說明)  (圖片擷自網路)	保育策略 迴避■縮小■減輕■補償□	確立保全對象之棲地，並明確劃設保留範圍 避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境 避開晨昏及夜間施工並降低噪音 縮短工期，減少棲地的擾動	保育措施： (迴避)迴避春夏季鳥類繁殖季施工減少干擾 (縮小)限縮施工便道範圍，降低棲地破壞 (減輕)限縮施作時段至 8:00~日落前 1 小時，並留意是否有幼雛或產卵，如有發現，交由當地鳥會處理 (減輕)增設生態爬坡(約每 150 公尺設一處)以利幼雛逃脫	■納入工程計畫方案 □未納入，原因：
	保育原則			
關注物種/福建金線蛙 (照片/圖片及相關說明)  (圖片擷自網路)	保育策略 迴避■縮小■減輕■補償□	確立保全對象之棲地，並明確劃設保留範圍 避開繁殖季施工，避免擾動工區以外環境 避開晨昏及夜間施工並降低噪音 縮短工期，減少棲地的擾動	保育措施： (迴避)迴避春夏季蛙類繁殖季施工減少干擾 (縮小)限縮施工便道範圍，降低棲地破壞 (減輕)限縮施作時段至 8:00~日落前 1 小時，並留意是否有個體或蛙卵，如有發現則撈移至工區外之鄰近水域 (減輕)增設生態爬坡(約每 150 公尺設一處)以利陸水域移動。	■納入工程計畫方案 □未納入，原因：
	保育原則			

南安溪寮小給2-13(安溪站)



北新港東小給3-1(仕安站)



長短樹小給3(仕安站)



寮子小給3-3(仕安站)



埔洋小給3-1；埔洋小給3-15(安溪站)



資料來源：農田水利灌溉管理整合雲系統

列印時間：2026/8/10 11:28

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄：

日期	事項	辦理內容摘要
115/4/13	現場勘查	由本處生態人員與現地小組長及耕作者到現場勘查，初步確認生態保育措施並於現場討論動物逃脫施設相關事宜。
115/8/5	說明會討論	經說明會討論，參與人員共識，希望顧及渠道輸水功能外，對於保育類動物應善加宣導物種及保育措施。

